

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PEMBANGUNAN MASJID ASY-SYUHADA RW 04 PERUM RUMPUN DIPONEGORO



**JLN. PARKIT PERUM RUMPUN DIPONEGORO RT 02 / RW 04
KELURAHAN MANGUNHARJO, KECAMATAN TEMBALANG
KODE POS : 50272**



**PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ASY-SYUHADA
RW 04 PERUM RUMPUN DIPONEGORO**

Jln. Parkit RT 02 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kode Pos : 50272

No. : 009/PP-MNH/VI/2019
Lamp : 1 berkas LPJ
Hal : **Laporan Pertanggungjawaban**

Semarang , April 2019

Yth. PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4

Di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Atas berkat rahmat Allah Swt., dengan ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban bantuan dari PT. Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang untuk Pembangunan Masjid Asy-Syuhada yang terletak di Jln. Parkit RT 02 / RW 04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang sebesar Rp15.000.000,00 (*limabelas juta rupiah*).

Sebagaimana yang telah disampaikan pada proposal kami bahwa Pembangunan Masjid Asy-Syuhada diperlukan dana \pm **885 juta** , sementara *dana swadaya masjid Asy-Syuhada hanya 190 juta*. Oleh karena itu, bantuan tersebut telah kami pergunakan untuk pengadaan bahan-bahan bangunan yang rinciannya seperti terlampir pada laporan ini.

Demikian surat laporan ini kami sampaikan kepada PT.Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang, agar menjadikan periksa adanya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Ketua Panitia

HM.S. Hudiyono,S.Kp.NS, MH.Kes.



Sekretaris

Ristonno, S.Pd.

Mengetahui,
Ketua Takmir Masjid Asy-Syuhada

H. Mochamad Isa Anisori, S.Sos.



**PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ASY-SYUHADA
RW 04 PERUM RUMPUN DIPONEGORO**

Jln. Parkit RT02 Kelurahan Mangunharjo – Kecamatan Tembalang Kode Pos : 50272


**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
BANTUAN PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 4 SEMARANG**

1. BESAR BANTUAN : **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah)

2. PENGGUNAAN BANTUAN.
 - a. Pembelian 4m³ Hebel bata ringan 10cm (@m³ Rp750.000,00) = Rp3.000.000,00
 - b. Pembelian 2 sak perekat Hebel (@ Rp70.000,00) = Rp140.000,00
 - c. Pembelian 70 dus keramik dinding 30x60cm (@ Rp97.000,00) = Rp6.790.000,00
 - d. Pembelian 90 dus keramik lantai 30x30cm (@ Rp57.000,00) = Rp5.130.000,00


Jumlah = Rp15.060.000,00

Ketua Panitia


HM.S. Hudiyono.S.Kp.NS, MH.Kes.



Semarang, 20 April 2019
Bendahara


Joko Supriyono, A.Md.

nama perusahaan : PT. ...

alamat :

no. rekening bank : ...

nama penerima : ...

jumlah :

Rp. 15.000,00



TB. GUNJUNG MAS NUSANTARA JAYA

FAKTUR NOMOR : 001902

Semarang 23 Maret 2018

Capada Yth

Masptd Asy Syubadi

0. Pabrik Pemas Kumpulan Lipowetogo Same

NOTA PEMBELIAN

Di bawah ini kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	QTY	HARGA JUAN	JML. HARGA
1	Hotel / Room Kandang P115m	400	780.000	312.000.000
2	Perabot Hotel	2.000	70.000	140.000.000
3	Keramik Lantai 40 X 40 Gray Diklatu	75.000	27.000	2.025.000.000
4	Keramik Lantai 40 X 40 Gray Diklatu	75.000	27.000	2.025.000.000



Jual Bahan Bangunan
Persewaan Tratak & Peralatan Pesta

Semarang, 23/3/19 20

Kepada Yth. Mas jrd

Tuan Asyhu Hadala

Toko Elang

No. : 001902

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 m ³	Hebel 10 cm		3.000.000.
2	Tub perekat Hebel.		190.000.
70	Dur 30/60 Dapda Berge		6.790.000.
90	Dur 30/30 Dslan Berge.		5.130.000.
			15.060.000.

LUNAS
TERIMA KASIH

Tanda Terima

PERHATIAN !!!
Barang yang sudah dibeli
tidak dapat dikembalikan/
ditukar kecuali ada perjanjian

Jumlah Rp.



Dinding Tempat Wudhu



Dinding Tempat Wudhu setelah di Plester



Pemasangan Keramik Dinding dan Lantai Tempat Wudhu



Tempat Wudhu dan kamar Mandi Wanita



Tempat Wudhu Pria



TERIMA KASIH PT. KERETA API INDONESIA



PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAERAH OPERASI 4 SEMARANG

Sudah terima dari : **PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 4 SEMARANG**
Jumlah Uang : **==Lima belas juta rupiah==**

Untuk pembayaran : Bantuan Bina Lingkungan Sarana Ibadah Pembangunan Masjid Asy Syuhada
Jl. Parkit Perum Rumpun Diponegoro RT.02/04 Kel. Mangunharjo Kec.
Tembalang Kota Semarang

Semarang, 20 Maret 2019

Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada

Terbilang : Rp. 15.000.000,00

H. MOCHAMAD ISA ANSORI, S.Sos
NIK. 337405180550001



KERETA API

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

**BANTUAN BINA LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN MASJID ASY SYUHADA**

Nomor : 06/BL-D4/III/2019



Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-03-2019) kami yang bertanda-tangan dibawah ini.

Nama : USTADI
Jabatan : Manager Keuangan Daop 4 Semarang
Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 3 Semarang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : H. MOCHAMAD ISA ANSORI, S.Sos.
Jabatan : Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada
Alamat : Jl. Parkit Perum Rumpun Diponegoro RT.02/04 Kel. Mangunharjo Semarang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang menyerahkan (Tunai) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Bantuan Bina Lingkungan Sarana Ibadah Pembangunan Masjid Asy Syuhada sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata KAI untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi Negeri dan Rakyat Indonesia melalui Program Bina Lingkungan.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban bantuan tersebut selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal penyerahan bantuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2019

PIHAK KEDUA
Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada

Materai
6000

H. MOCHAMAD ISA ANSORI, S.Sos
NIK. 337405180550001

PIHAK PERTAMA
PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)
Manager Keuangan Daop 4 Semarang

USTADI
NIPP. 39622

Saksi

Bendahara

JOKO SUPRIYONO
NIK. 3374101311700002

Manager Kesehatan Daop 4 Semarang


TRİYONO
NIPP. 44567

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN BINA LINGKUNGAN SARANA IBADAH
PEMBANGUNAN MASJID ASY SYUHADA
JL. PARKIT PERUM RUMPUN DIPONEGORO RT. 02/04 KEL. MANGUNHARIO KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG
DAOP 4 SEMARANG

NO	URAIAN	EVALUASI DAOP 4 SEMARANG			PERSETUJUAN KANTOR PUSAT				
		VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Pekerjaan Tempat Wudhu								
	1 Pasangan Bata Ringan	1	paket	2.550.000	2.550.000	1	paket	2.000.000	2.000.000
	2 Pasangan Lantai Keramik 30 X 30 cm Unpolished	1	paket	5.925.000	5.925.000	1	paket	5.500.000	5.500.000
	3 Pasangan Lantai Keramik 30 X 60 Cm Polished	1	paket	7.991.000	7.991.000	1	paket	7.500.000	7.500.000
	Jumlah :				16.466.000		Disetujui		15.000.000
	Terbilang :	Lima belas juta rupiah							

Bandung, 04 Maret 2019

Mengetahui,


 USS
AGUS SUPRIYONO
 NIPP. 45741

USSP


AGUS SETIJONO
 NIPP. 43190



PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ASY-SYUHADA RW 04 PERUM RUMPUN DIPONEGORO

Jln. Parkit RT 02 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kode Pos : 50272

PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID ASY-SYUHADA

A. DASAR PEMIKIRAN

Kami warga Perum Rumpun Diponegoro RW 04 telah puluhan tahun beribadah di Masjid Asy-Syuhada yang berdiri di hamparan tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$. Selama itu pula masjid yang kokoh dan indah berjemur pada teriknya panas matahari dan guyuran hujan. Perapuhan pun terjadi akibat fenomena alam bertahun-tahun tersebut. Masjid Asy-Syuhada yang dulu megah, kokoh dan indah, kini atapnya lapuk dan ruangnya sangat panas. Kami sangat prihatin dengan saudara-saudari kaum muslimin/muslimat yang beribadah di dalamnya, karena mereka tidak lagi menemukan kenyamanan dan ketenangan dalam berserah diri kepada Allah Swt.

Dari permasalahan tersebut, selayaknya jika Masjid Asy-Syuhada saat ini sangat membutuhkan perhatian dan penanganan dengan cara direnovasi dan diperluas ruangnya. Hal ini perlu dilakukan karena masjid merupakan sarana ibadah kaum muslimin/muslimat, tempat yang tepat untuk interaksi antara makhluk dan kholik-Nya, sehingga akan tercipta hubungan yang khushuk saat beribadah kepada Allah Swt.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan adalah mengajak umat islam baik yang ada di lingkungan masjid Asy-Syuhada dan sekitarnya, ataupun seluruh umat islam yang peduli untuk kemajuan syiar islam, untuk ikut serta dalam pembangunan masjid Asy-Syuhada. Hal ini berorientasi pada harapan-harapan kami sebagai berikut :

- a. Masjid sebagai sarana ibadah yang asri dan nyaman
- b. Menciptakan sarana pendidikan yang diwujudkan dalam Madrasah Diniyah (Madin)
- c. Pengalaman beragama yang hakiki
- d. Membangun sarana dan prasarana aktivitas religius kemasyarakatan

C. NAMA, TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

1. Nama kegiatan : Pembangunan Masjid Asy-Syuhada
2. Tempat (lokasi) : Di Jln. Parkit RT 02 / RW 04 Perum Rumpun Diponegoro
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang
3. Waktu : Pembangunan dimulai Bulan Agustus 2018 hingga selesai

D. JENIS KEGIATAN

Adapun Jenis Kegiatannya antara lain :

1. Renovasi atap masjid
2. Penambahan ruang masjid (pembuatan balkon)
3. Renovasi tempat wudu dan toilet

E. ANGGARAN BIAYA

- Anggaran biaya sementara secara global sebesar **Rp885.000.000** ,- (Vide RAB masjid Asy-Syuhada).
- Dana Swadaya Masjid Asy-Syuhada **Rp190.000.000** ,- . Masih diperlukan dana sebesar **\pm Rp695.000.000** ,- lagi.

F. SUMBER DANA

Adapun sumber dana yang diharapkan didapat dari :

- Kas Infaq dan amal masjid Asy-Syuhada
- Pengurus Ta'mir Masjid Asy-Syuhada
- Sumbangan swadaya masyarakat
- Para donatur
- Sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat

G. KEPANITIAAN

Susunan kepanitiaan terlampir

H. PENUTUP

Rasa syukur yang tak terhingga kami sampaikan pada Allah Swt., atas tersusunnya proposal ini. Ucapan terima kasih atas segala kerendahan hati dari Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil demi terlaksananya renovasi pembangunan Masjid Asy-Syuhada yang menjadi dambaan kami pada khususnya dan umat islam pada umumnya.

Hanya atas kebesaran-Nyalah usaha Panitia Pembangunan Masjid Asy-Syuhada ini dapat tercapai. Kami hanya berusaha, Allah jugalah yang menentukan segalanya.

Semarang, 10 Juni 2018
Sekretaris

Ketua Panitia

HM.S. Hudiyono, S.Kp, NS, MH.Ks.


Ristono, S.Pd.

Mengetahui,

Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada

H. Mochamad Isa Ansori, S.Sos.

Mengetahui,

Ketua LPMK Kelurahan Mangunharjo

Pramadjiarto, S.E.

Mengetahui,

Ketua RW.04 Kelurahan Mangunharjo

Suhendro Indra Kelana, S.E.

Mengetahui,

Camat Tembalang

Heroe Soekendar, S.Sos.

NIP. 19680110 198803 1 005

Mengetahui,

Lurah Kelurahan Mangunharjo

Yulianto, S.E.

NIP. 1940707 198607 2 001

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEKERJAAN MASJID ASY-SYUHADA
PERUM RUMPUN DIPONEGORO MANGUNHARJO TEMBALANG
LOKASI : KOTA SEMARANG

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Satuan (Rp)	Total Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN STRUKTUR		
	1.1 Pekerjaan Struktur Bawah		
1	Galian tanah pondasi footplat	4.500.000,00	
2	Urugan sirtu bawah pondasi footplat, t = 15 cm	5.566.766,70	
3	Lantai kerja bawah pondasi footplat, t = 5 cm	6.044.391,51	
4	Urugan tanah kembali pondasi footplat	3.518.031,00	
5	Galian tanah pondasi batu belah	3.308.800,00	
6	Urugan sirtu bawah pondasi batu belah, t = 20 cm	3.787.520,00	
7	Pasangan pondasi batu belah 1 : 5	24.960.151,04	
8	Urugan tanah kembali pondasi batu kali	797.866,67	
9	Urugan tanah peninggian dan dipadatkan	6.224.181,68	
10	Urugan pasir bawah lantai, t = 10 cm	7.626.734,83	
11	Plat dasar beton wiremesh M6 K. 225, t = 10 cm	22.113.638,87	
12	Urugan pasir bawah sloof, t = 10 cm	3.002.630,40	
13	Lantai Kerja bawah sloof, t = 5 cm	4.857.874,85	
14	Pekerjaan urugan pasir bawah rollag bata	555.575,99	
16	Pekerjaan beton bertulang foot plat K. 300 type F1	44.251.523,53	
18	Pekerjaan beton bertulang sloof K. 300 type S1	28.726.284,30	
20	Pekerjaan beton bertulang praktis K. 225 type Sp	660.518,06	
21	Pekerjaan beton bertulang kolom K. 300 type K0	3.109.916,52	
22	Pekerjaan beton bertulang kolom pedestal K. 300 type K1a	29.639.760,91	
Jumlah Total 1.1 Pekerjaan Struktur Bawah			203.252.166,87
	1.2 Struktur Lantai 01		
1	Pekerjaan beton bertulang kolom lantai 1 K. 300	5.753.016,52	
2	Pekerjaan beton bertulang kolom lantai 1 K. 300 type K1a	54.563.640,97	
3	Pekerjaan beton bertulang balok lantai 2 K. 300 type G1	6.621.403,90	
4	Pekerjaan beton bertulang balok lantai 2 K. 300 type B3K	2.212.501,20	
5	Pekerjaan beton bertulang plat lantai 2 K. 300 type S1 tebal 12 cm	25.550.010,00	
6	Pekerjaan beton bertulang kolom tempat wudlu K. 175 type Kp	812.375,41	
7	Pekerjaan beton bertulang ring balk tempat wudlu K. 225 type Rb	2.292.926,27	
Jumlah Total 1.2 Pekerjaan Struktur Lantai 01			97.805.874,27

	1.3 Struktur Lantai 02		
1	Pekerjaan beton bertulang kolom lantai 2 K. 300 type K1b	40.505.764,77	
2	Pekerjaan beton bertulang balok lantai atap 1 K. 300 type G2	6.392.464,85	
3	Pekerjaan beton bertulang balok lantai atap 1 K. 300 type G2K	1.561.305,08	
4	Pekerjaan beton bertulang talang lantai atap 1 K. 300	9.437.305,36	
5	Waterprofing integral plat lantai atap 1	3.535.926,24	
Jumlah Total II.1.3 Pekerjaan Struktur Lantai 02			61.432.766,31
	II.1.4 Struktur Atap		
	II.1.6 Struktur Lantai Atap		
1	Pekerjaan beton bertulang kolom lantai atap 3 K. 300 type K4	4.454.696,94	
2	Pekerjaan beton bertulang ring balok K. 300 type B4	10.876.892,22	
3	Pekerjaan beton bertulang balok latiu lantai atap K. 225	10.615.380,58	
4	Pekerjaan beton bertulang listplank lantai atap 3 K. 300	23.810.572,19	
5	Pekerjaan genteng plentong	18.082.610,00	
Jumlah Total II.1.6 Pekerjaan Struktur Lantai Atap			67.840.151,93

	II.1.7 Struktur Tangga		
	Lantai 1 Ke Lantai 2		
1	Pekerjaan beton bertulang plat tangga K. 225	9.504.835,00	
2	Pekerjaan beton bertulang anak tangga K. 225	6.252.157,91	
3	Pekerjaan beton bertulang plat bordes K. 225	5.306.927,65	
4	Pekerjaan beton bertulang balok bordes K. 225	3.619.364,56	
Jumlah Total II.1.7 Pekerjaan Tangga			24.683.285,11
	II.1.8. Pekerjaan Struktur Atap		
6	Pekerjaan Pengecatan besi	3.500.000,00	
Jumlah Total II.1.8 Pekerjaan Struktur Atap			3.500.000,00
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
	2.1 Pekerjaan Arsitektur Lantai 1		
	2.1.1 Pekerjaan Pasangan Lantai 1		
1	Pasangan dinding bata ringan 1 : 6	38.152.528,93	
2	Plesteran dinding bata ringan 1 : 3	1.920.200,73	
3	Acian dinding bata ringan	21.096.186,70	
4	Sponengan sudut	6.500.000,00	
5	List gypsum 8 x 8 cm	1.874.446,86	
6	List plafond PVC motif lambersiring	2.760.000,00	
7	Pasangan lantai homogenous tile 60 x 60 cm polished	19.500.000,00	
8	Pasangan lantai ht 60 x 60 cm polished - Cutting Mozaik	2.360.550,06	
9	Bak kontrol 40 x 40 cm	2.805.165,00	
10	Batu alam andesit bakar	4.500.000,00	
11	Pengecatan dinding dengan cat eksterior	5.113.932,82	
12	Pengecatan dinding dengan cat interior	7.500.000,00	
13	Pengecatan plafond dengan cat plafond	1.098.921,18	
Jumlah Total II.2.1.1 Pekerjaan Pasangan Lantai 1			115.181.932,29


	2.1.2 Pekerjaan Kusen kayu Lantai 1		
	Pekerjaan kosen dan daun pintu / jendela asesorisnya terpasang sesuai gambar :		
1	Pekerjaan kusen type P1	20.850.000,00	
2	Pekerjaan kusen type BV1	4.952.000,00	
3	Pekerjaan kusen type J1	8.940.000,00	
Jumlah Total II.2.1.2 Pekerjaan Kusen Kayu Lantai 1			34.742.000,00
	2.1.3 Pekerjaan Tempat Wudhu		
1	Pasangan bata ringan 1 : 3	2.549.620,15	
2	Plesteran 1 : 3	1.230.146,72	
3	Acian	643.568,75	
4	Pasangan lantai keramik 30 X 30 cm unpolished	5.925.260,00	
5	Pasangan keramik dinding 30 x 60 polished	7.991.258,00	
6	Pasir urug	6.851.240,00	
7	Pasangan bata ringan 1 : 3 tanggulan tempat wudhu	2.549.620,15	
8	Pasang kran air stainless	8.516.204,54	
9	Pasangan floor drain	11.812.570,00	
Jumlah Total II.2.1.3 Pekerjaan Lavatory Lantai 1			48.069.488,31
	2.1.3 Pekerjaan Tangga Lantai 1 - 2		
1	Pekerjaan Pasang Homogeneous tile 60 x 60 cm polished	8.000.000,00	
3	Handrail stainless steel	7.550.400,00	
4	Railing Tangga stainless steel	10.824.660,00	
Jumlah Total II.2.1.3 Pekerjaan Tangga Lantai 1-2			26.375.060,00

	2.2 Pekerjaan Arsitektur Lantai 2		
	II.2.2.1 Pekerjaan Pasangan Lantai 2		
1	Pasangan dinding bata ringan 1 : 6	26.667.464,61	
2	Plesteran dinding bata ringan 1 : 6	25.394.598,88	
3	Acian dinding bata ringan	14.043.425,62	
4	Sponengan sudut	4.293.727,90	
5	Plafond gypsum 9 mm rangka hollow galvanis	26.301.726,11	
6	List gypsum 8 x 8 cm	3.721.289,72	
7	Plafond PVC motif lambersiring rangka galvanis	6.984.945,00	
8	List plafond PVC motif lambersiring	725.709,00	
9	Pasangan lantai homogenous tile 60 x 60 cm polished	10.500.000,00	
10	Beton expose	1.304.888,81	
11	Pengecatan beton expose dengan cat eksterior	1.707.038,22	
12	Pengecatan dinding dengan cat eksterior	8.373.691,17	
13	Pengecatan dinding dengan cat interior	12.009.311,13	
14	Pengecatan plafond dengan cat plafond	2.827.802,80	
15	Pasangan railing stainless steel	12.120.570,00	
Jumlah Total II.2.2.1 Pekerjaan Pasangan Lantai 2			156.976.188,97

	II.2.2.2 Pekerjaan Kusen Kayu Lantai 2		
	Pekerjaan kosen dan daun pintu / jendela dan hardware dan assesorisnya terpasang sesuai gambar :		
1	Pekerjaan kusen type PJ	15.624.000,00	
2	Pekerjaan kusen type BV2	1.711.000,00	
3	Pekerjaan kusen type J6	16.836.000,00	
Jumlah Total II.2.2.2 Pekerjaan Kusen Kayu Lantai 2			34.171.000,00
3	Ornamen GRC	11.000.000,00	
			11.000.000,00
JUMLAH			885.029.914,06
DIBULATKAN			885.000.000,00

Terbilang : " Delapan Ratus delapan Puluh Lima Juta Rupiah"

Ketua Panitia Pembangunan
Masjid Asy-Syuhada



ASY-SYUHADA

[Handwritten Signature]

HM. S HUDIYONO, S.Kp. Ns. Mh.Kes



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M.Hum

SANYOTO, S pd

DR. H. ALEX SIJANTO, SES.Pd, MM

H. A. SODIK

H. SUFOPG

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp, NS, MH, Kes

GAMBAR

SKALA

PERSPEKTIF

 PERSPEKTIF
SKALA 1 : MTS



HALAMAN

JML. HALAMAN



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M.Hum

SANTOYO, S.pd

DR. H. ALEX SUDANTO, SES.Pd, MM

H. A. SODIK

H. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. RUDIYONO, S.Kp,NS, MH.Kes


GAMBAR

SKALA

DENAH LANTAI 2
1 : 100

HALAMAN

JML. HALAMAN

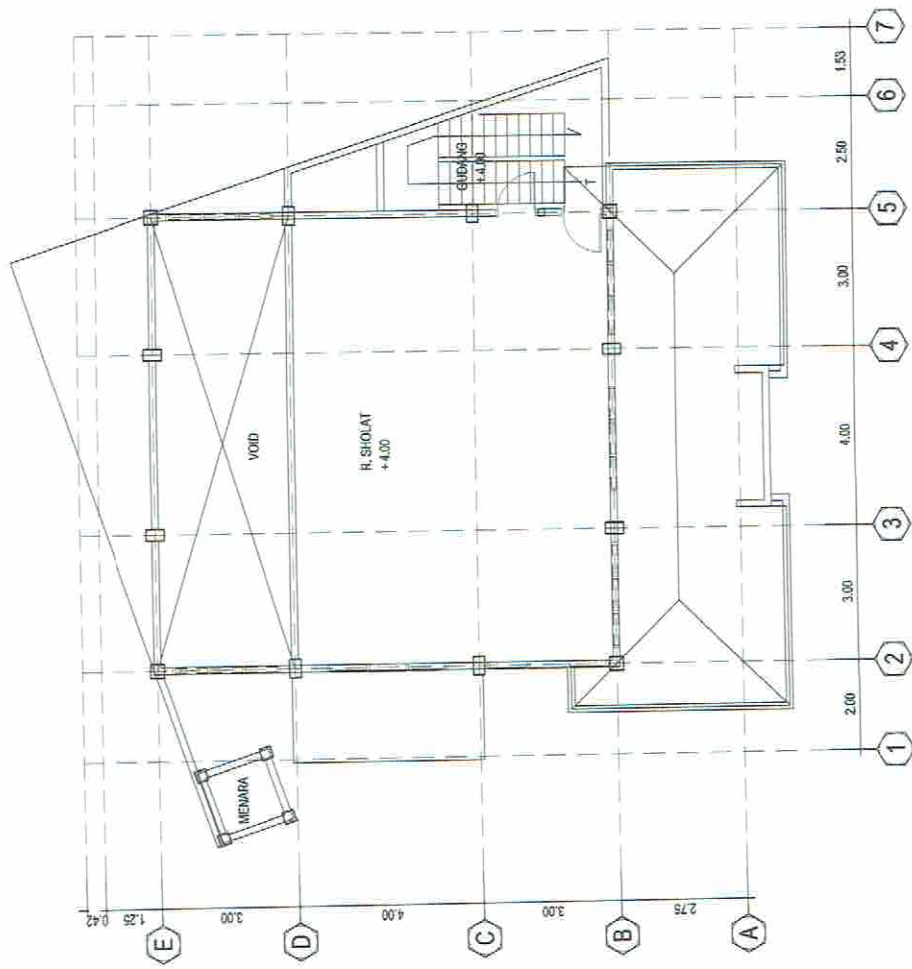

DENAH LANTAI 2
SKALA 1 : 100



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SIWARJO, S.I, M.Hum

SANYOTO, S pd

DR. H. ALEX SIJANTO, SES.Pd, MM

H. A. SODIK

H. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S. Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp.,NS.,MH.Kes

GAMBAR


SKALA

TAMPAK DEPAN

1 : 100

HALAMAN

JML. HALAMAN

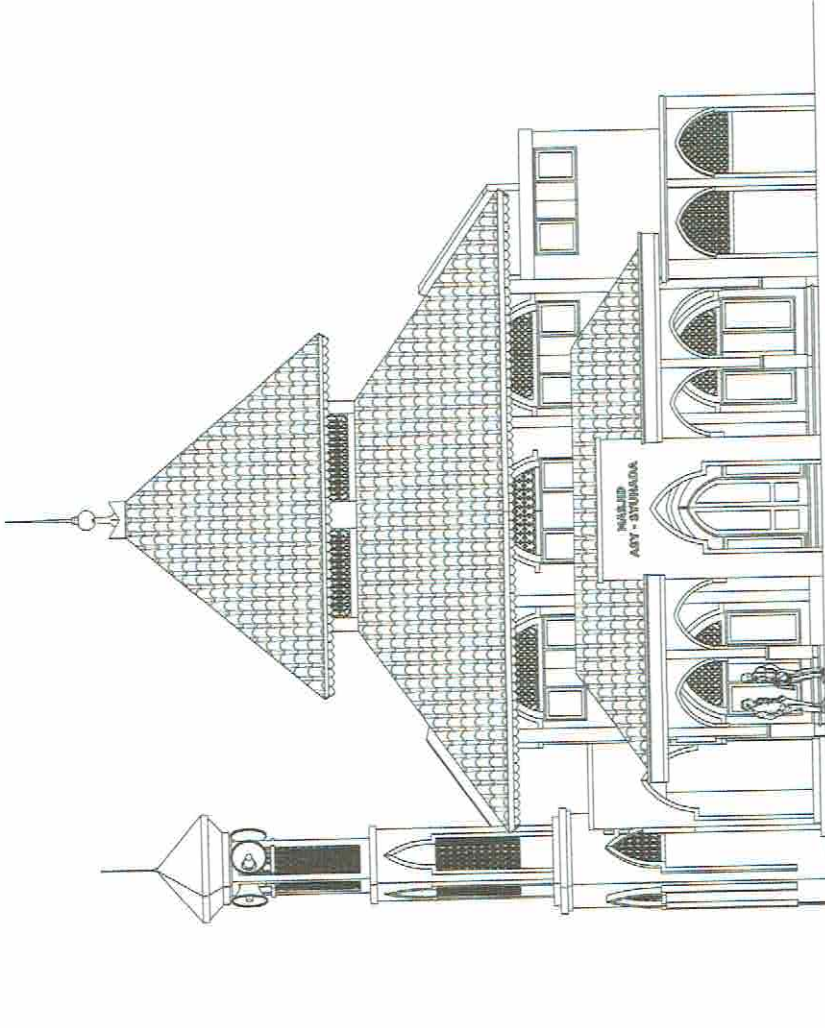

TAMPAK DEPAN
SKALA 1 : 100



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M.Hum

SANTOTO, S Pd

DR. H. ALEX SUJANTO, SE.S.Pd.MM

H. A. SODIK

H. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp.NS.MH.Kes


GAMBAR

SKALA

TAMPAK SAMPIING 1 : 100

HALAMAN

JML. HALAMAN

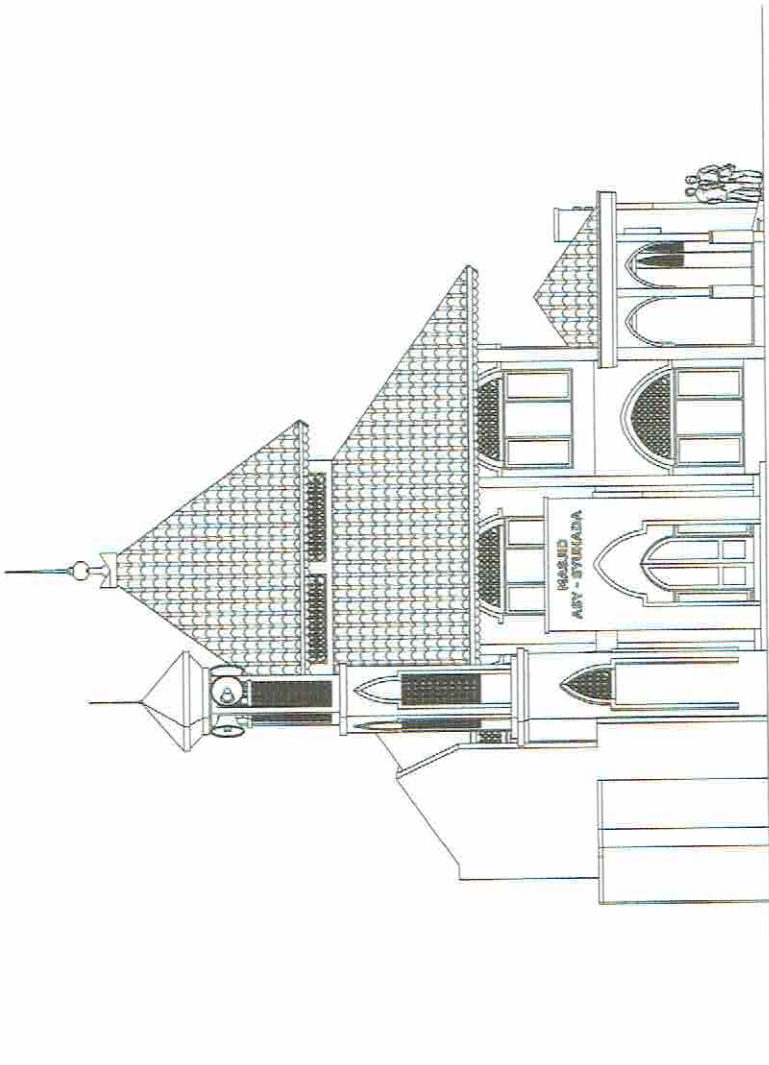

TAMPAK SAMPIING
SKALA 1 : 100



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M.Hum

SANYOTO, Spd

DR. H. ALEX SUJANTO, SES.Pd, MM

H. A. SODIK

H. SITOPRO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp,NS,MIH Kes

GAMBAR


SKALA

DENAH FOOT PLAT

1 : 100

HALAMAN

JML. HALAMAN

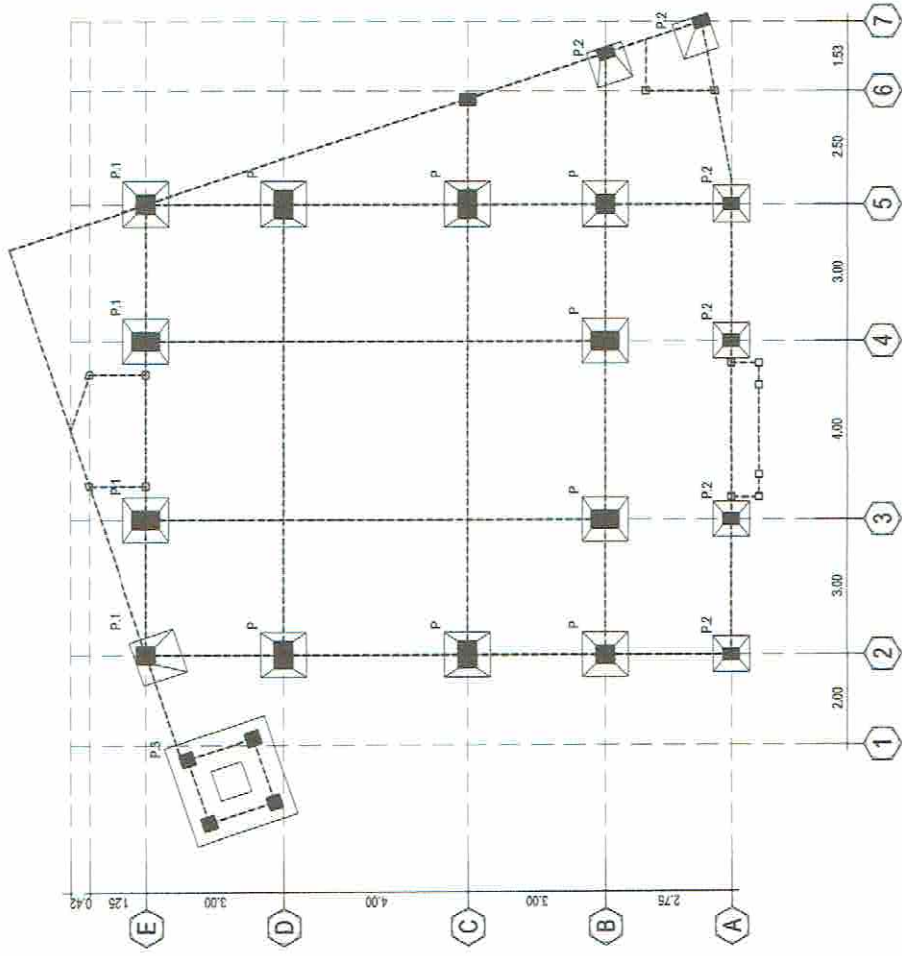

DENAH PONDASI FOOTPLAT

SKALA 1 : 100



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY-SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M.Hum

SANYOTO, S.pd

DR. H. ALEX SUJANTO, SES.Pd, MM

H. A. SODIK

H. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

DETAIL BALOK 1 : 20

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp, NS, M.HKes

GAMBAR




SKALA

DETAIL FOOT PLAT

1 : 20


HALAMAN

JML. HALAMAN

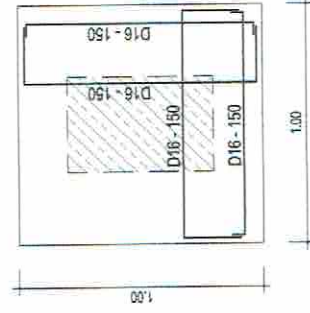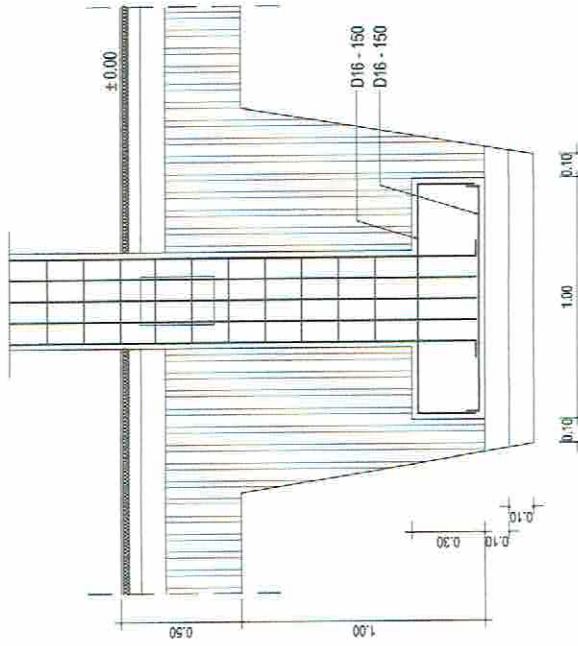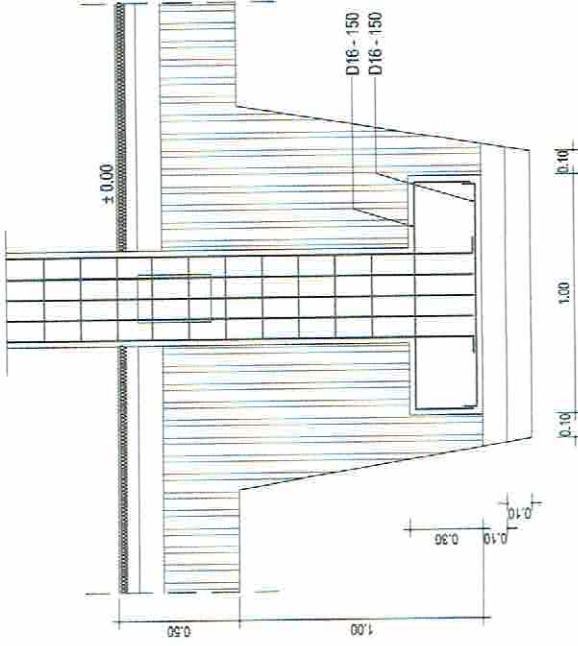

DETAIL FOOTPLAT (P.1)

SKALA 1 : 20

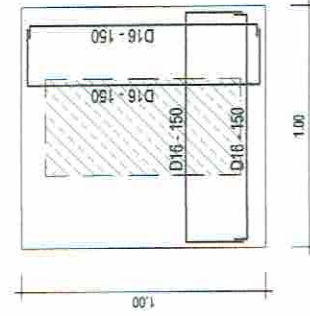

DETAIL FOOTPLAT (P)

SKALA 1 : 20





PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL SUWARTO, SH, M.Hum

SANYOTO, Spd

DR. H. ALEX SUWANTO, SE.SPI, MM

H. A. SODIK

H. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp, NS, MH, Kes

GAMBAR


SKALA

DENAH KOLOM LT. 1

1 : 100

HALAMAN

JML. HALAMAN

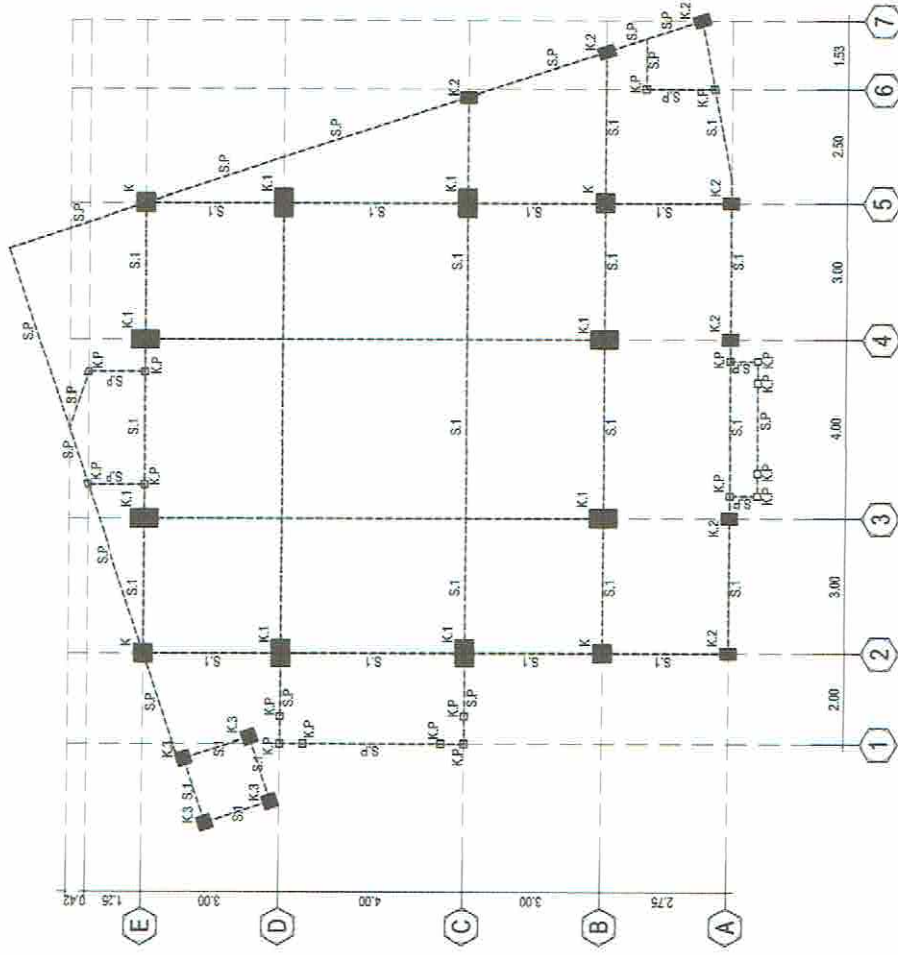

DENAH KOLOM DAN SLOOF LANTAI 1
SKALA 1 : 100



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M.Hum

SANYOTO, S.pd

DR. H. ALEX SUHANTO, SE, S.Pd, MM

H. A. SODIK

H. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp, NS, MH, K.es


GAMBAR

SKALA

DENAH KOLOM LT. 2
1 : 100

HALAMAN

JML. HALAMAN

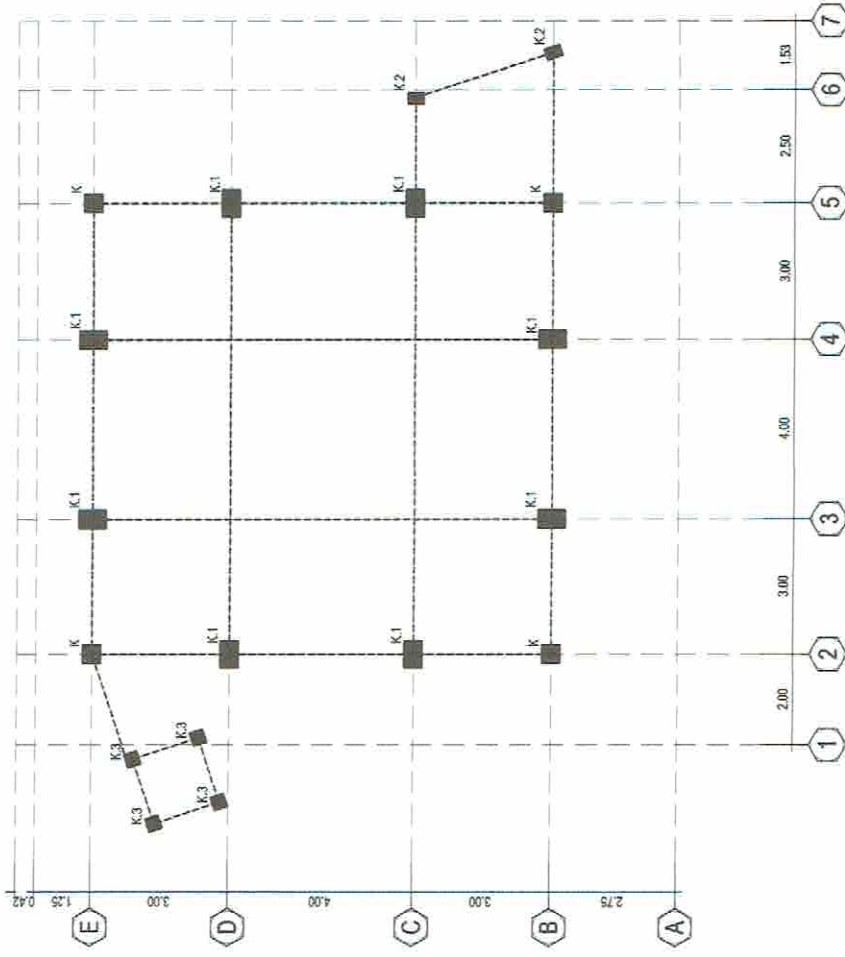

DENAH KOLOM LANTAI 2
SKALA 1 : 100



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, S.H, M.Hum

SARYOTO, S pd

DR. H. ALEX SUANTO, SE.S.Pd, MM

H. A. SOHIR

H. SITORO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUJIYONO, S.Kp,NS, MH,Kes

GAMBAR






SKALA

DETAIL KOLOM

1 : 20

HALAMAN

JML. HALAMAN

KOLOM K (40 x 60)	20 D 16	SENGKANG LUAR Ø8-120 (Tumpuan) Ø8-150 (Lapangan)	
KOLOM K.1 (40 x 60)	16 D 16	SENGKANG LUAR Ø8-120 (Tumpuan) Ø8-150 (Lapangan)	
KOLOM K.2 (25 x 35)	8 D 13	SENGKANG LUAR Ø8-120 (Tumpuan) Ø8-150 (Lapangan)	
KOLOM K.2 (25 x 35)	4 D 16 4 D 13	SENGKANG LUAR Ø8-120 (Tumpuan) Ø8-150 (Lapangan)	
KOLOM Kp (15 x 15)	4 Ø 10	SENGKANG LUAR Ø 8-150 (Tumpuan) Ø 8-150 (Lapangan)	



PEKERJAAN

RENOVASI PEMBANGUNAN
MASJID ASY - SYUHADA

DEWAN PENASEHAT

KOMPOL. SUWARTO, SH, M Hum

SANYOTO, S pd

DR. H. ALEX SUANTO, SE, S Pd, MM

H. A. SODIK

IL. SUTOPO

PENANGGUNG JAWAB

KETUA TAKMIR

H. MOCH. ISA. ANSORI, S.Sos

KETUA PANITIA

HM. S. BUDIYONO, S.Kp.NS.MH.Kes

GAMBAR

SKALA

DETAIL SLOOF

1 : 20

HALAMAN

JML. HALAMAN

TABEL PENULANGAN SLOOF

BALOK KODE	TULANGAN	TUMPUAN KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN
SLOOF S.1 (20 X 30)	TULANGAN ATAS	2 D 13	3 D 13	2 D 13
	TULANGAN SAMPIING	-	-	-
	TULANGAN BAWAH	3 D 13	2 D 13	3 D 13
	TULANGAN SENGKANG (BEUGEL)	Ø6 - 200	Ø6 - 150	Ø6 - 200
SLOOF S.P (15 X 20)	GAMBAR PENULANGAN			
	TULANGAN	TUMPUAN KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN
	TULANGAN ATAS	2 D 10	2 D 10	2 D 10
	TULANGAN SAMPIING	-	-	-
TULANGAN BAWAH	2 D 10	2 D 10	2 D 10	
TULANGAN SENGKANG (BEUGEL)	Ø6 - 150	Ø6 - 200	Ø6 - 200	
SLOOF S.P (15 X 20)	GAMBAR PENULANGAN			
	TULANGAN	TUMPUAN KIRI	LAPANGAN	TUMPUAN KANAN
	TULANGAN ATAS	2 D 10	2 D 10	2 D 10
	TULANGAN SAMPIING	-	-	-
TULANGAN BAWAH	2 D 10	2 D 10	2 D 10	
TULANGAN SENGKANG (BEUGEL)	Ø6 - 150	Ø6 - 200	Ø6 - 150	

Gunakan Batu Pertama dari Masjid Agung Demak

■ Masjid Asy Syuhada Rumpun Diponegoro Direnovasi

MASJID Asy Syuhada, di kompleks Perumahan Rumpun Diponegoro, RW 04 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, telah berdiri sejak 1986. Masjid yang berada di Jl Parkit, Mangunharjo, itu dibangun di atas lahan 200 meter persegi, dan berlokasi di kawasan perumahan dengan fasilitas PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Mayoritas penghuninya pensiunan ABRI (kini TNI) dan Polri yang pernah berjuang melawan penjajah. Karena itu, penduduk Mangunharjo mengenal Syuhada, sebagai masjid bagi pensiunan ABRI dan Polri. Setelah 32 tahun berdiri, kini masjid direnovasi karena jamaah semakin banyaknya.

Batu pertama untuk pembangunan Masjid Syuhada, dulu dari Masjid Agung Demak. Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada, Mochamad Isa Ansori menjelaskan, penggunaan batu-batu Masjid Demak supaya tempat ibadah itu memiliki kebaikan bagi umat.


"Kami berharap jamaah di Masjid Asy Syuhada semakin banyak. Selain itu umat Muslim makin betah dan khusyuk beribadah," kata Ansori didampingi Ketua Panitia Masjid Asy Syuhada, M S Hudiyo dan Ketua RW04 Mangunharjo Suhendro Indra Kelana di sela-sela renovasi masjid.

Nama Syuhada berarti orang mati syahid sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Nama itu sengaja dipakai supaya para penghuni, termasuk pensiunan ABRI dan

Polri kelak bisa mati syahid atau khusnul khotimah.

Hudiyo menambahkan, kondisi masjid saat ini kurang mendukung karena jamaah bertambah banyak. Apalagi, jadi tempat belajar mengajar kajian ilmu agama Islam seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Yasinan tiap malam Jumat. Pembangunannya dibuat dua lantai, dari semula berlantai satu. Adapun, progres pembangunannya hampir 50 persen, dan kini dilakukan pengecoran lantai dua.

Total dana dibutuhkan Rp 885 juta, terkumpul donatur dan swadaya Rp 191 juta. "Banyak warga membantu kebutuhan material, seperti pasir, semen, dan besi. Panitia membuka kotak infak dan masih cari bantuan dana untuk penyelesaian masjid. Menurut Suhendro, ibadah di masjid tetap berjalan meski dalam tahap renovasi. Pekan lalu, warga menunaikan shalat Jumat di jalan dengan menggelar tikar. Penduduk RW04 Mangunharjo ini pernah meraih penghargaan dari Pemkot Semarang pada 2017 sebagai kampung agamis dan toleran. (Royce Wijaya SP-48)

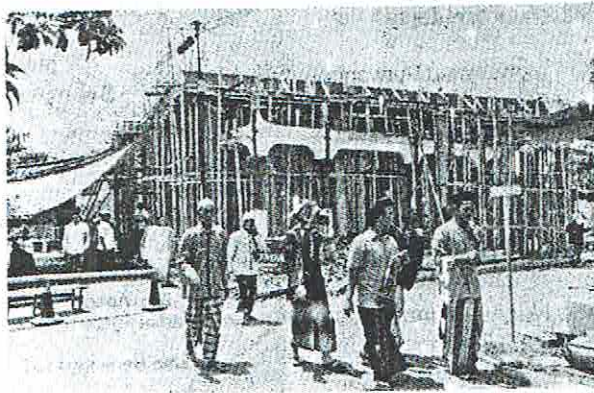

SM/Royce Wijaya SP

SEUSAI SHALAT: Warga RW 04 Mangunharjo, Kecamatan Tembalang meninggalkan Masjid Asy Syuhada seussai shalat Jumat, baru-baru ini. (48)

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID ASY SYUHADA SAAT INI





Keadaan Tempat wudu dan toilet Pa/Pi masih jadi satu



Keadaan Eternit ruang Masjid Asyuhada



Keadaan Bagian Imam dan Mimbar Masjid Asyuhada

LAMPIRAN FOTO KOPI KTP

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ASY SYUHADA




KETUA PANITIA



SEKRETARIS



BENDAHARA



KERETA API

BERITA ACARA SERAH TERIMA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
BANTUAN BINA LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN MASJID ASY SYUHADA
Nomor : 06/BL-D4/III/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-03-2019) kami yang bertanda-tangan dibawah ini.

Nama : USTADI
Jabatan : Manager Keuangan Daop 4 Semarang
Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 3 Semarang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : H. MOCHAMAD ISA ANSORI, S.Sos.
Jabatan : Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada
Alamat : Jl. Parkit Perum Rumpun Diponegoro RT.02/04 Kel. Mangunharjo Semarang

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang menyerahkan (Tunai) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Bantuan Bina Lingkungan Sarana Ibadah Pembangunan Masjid Asy Syuhada sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata KAI untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi Negeri dan Rakyat Indonesia melalui Program Bina Lingkungan.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban bantuan tersebut selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal penyerahan bantuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2019

PIHAK KEDUA
Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada



H. MOCHAMAD ISA ANSORI, S.Sos
NIK. 337405180550001

PIHAK PERTAMA
PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)
Manager Keuangan Daop 4 Semarang



USTADI
NIPP. 39622

Saksi

Bendahara

JONO SUPRIYONO
NIK. 3374101311700002

Manager Kesehatan Daop 4 Semarang

TRIYONO
NIPP. 44567



PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAERAH OPERASI 4 SEMARANG

Sudah terima dari : **PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 4 SEMARANG**
Jumlah Uang : **==Lima belas juta rupiah==**

Untuk pembayaran : Bantuan Bina Lingkungan Sarana Ibadah Pembangunan Masjid Asy Syuhada
Jl. Parkit Perum Rumpun Diponegoro RT.02/04 Kel. Mangunharjo Kec.
Tembalang Kota Semarang

Semarang, 20 Maret 2019

Ketua Takmir Masjid Asy Syuhada

Terbilang : Rp. 15.000.000,00



H. MOCHAMAD ISA ANSORI, S.Sos
NIK. 337405180550001
